

**170 VPP EN LA MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5, "POZA DEL AGUA"
CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSÁN**

Informe del estado de la obra a 30 de mayo de 2012

Sótanos 1 y 2 de garaje

- Se encuentra terminado el yeso en los trasteros y pasillos
- Se encuentra terminado el enfoscado en los paramentos del sótano 1 y se avanza en el 2
- Se encuentra prácticamente terminado el solado de los trasteros
- Se encuentra prácticamente terminado el saneamiento colgado en el sótano 1
- Comienza la instalación de las telecomunicaciones

Fachadas

- Terminadas las fachadas de ladrillo a falta de cierre de los puntos de entrada de material
- Terminadas las vigas metálicas para soporte de cerramiento de vidrio U Glas.

Particiones entre viviendas. Conductos de ventilación y bajantes sanitarias

- Terminadas las particiones entre viviendas y zonas comunes
- La división en el interior de las viviendas está terminada en los portales 11, 1 y 2, avanza en los portales 3 y 4 al 50% y en la 2ª planta del 5 y 6

Solados y alicatados

- Terminadas las soleras
- Se encuentra prácticamente terminado el alicatado en el portal 11

Instalaciones individuales

- Terminada la instalación de calefacción
- Terminada la instalación de fontanería por techo a falta de ejecución de los puntos de servicio
- Terminada la instalación de electricidad y telecomunicaciones a falta de puntos de servicio

Cubiertas

- Terminada la cubierta del edificio de viviendas en todos los portales excepto en el 10

Instalaciones generales

- Están prácticamente terminados los montantes de agua fría y caliente y calefacción, a falta de aislamiento y contadores
- Están prácticamente terminados los montantes de electricidad y teleco a falta de cables
- Están prácticamente terminados las instalaciones de columna seca y gas
- Terminadas las puertas de acceso y las guías de los ascensores en todos los portales

Plazo de obra


- Se estima que las obras terminarán a finales del mes de octubre de 2012.

Importe de obra certificado

- La certificación acumulada del mes de abril asciende al 54,32%.



FACHADA INTERIOR

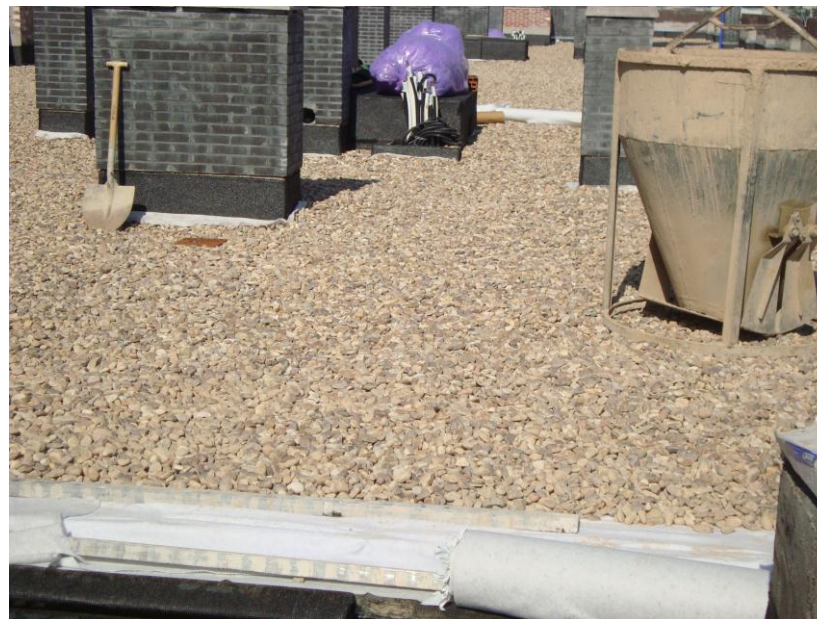

DETALLE ACABADO CUBIERTA



EJECUCION DE CUBIERTA



EJECUCION DIVISIONES EN INTERIOR DE VIVIENDA CON PLADUR



ALICATADO ASEOS



MUESTRA CARPINTERIA EN VENTANAS



MUESTRA FORRO PILARES. COLOR DEFINITIVO GRIS
